Kokybė, rizika ir projekto sėkmė: nuo atitikties iki vertės

Studijų modulis

Projektų rizikos ir kokybės valdymas

S190M182

Paskaitos autorės

doc. dr . Asta Daunorienė

doc. dr. Joana Ramanauskaitė

Doc. prakt. Akvilė Grigaliūnė

El. paštas

asta.daunoriene@ktu.lt

joana,ramanauskaite@ktu.lt

akvile.grigaliune@ktu.lt

Turinys

01

Projektas ir jo valdymas

Kas daro projektą projektu ir ką iš tikrųjų valdome?

02

Nuo rezultato iki poveikio

Output → Outcome → Benefit → Value → Impact

03

Kas yra projekto sėkmė?

Nuo geležinio trikampio iki vertės ir poveikio

04

Kodėl klystame?

Šališkumai, „zoom in, zoom out“

05

Kaip padidinti projekto sėkmę?

M.O.R.E

Pagrindinis paskaitos klausimas: ar gerai suvaldytas projektas visada yra sėkmingas projektas?

© KTU

Paskaitos tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:



Paaiškinti sėkmės sampratą

nuo projekto įgyvendinimo pagal laiką, biudžetą ir apimtį iki rezultatų, naudos, vertės ir ilgalaikio poveikio vertinimo.



Atskirti projekto rezultatą (output), rezultatą naudotojui / organizacijai (outcome), naudą (benefit), vertę (value) ir poveikį (impact)


ir paaiškinti jų tarpusavio ryšį konkretaus projekto pavyzdžiu.

© KTU

01

Projektas ir jo valdymas

Kas daro projektą projektu ir ką iš tikrųjų valdome?



Pradėkime nuo jūsų patirties



DISKUSIJA

Poromis · 7 min.

Užsirašykite atsakymus

1. **Kas yra projektas?**
2. **Kokios charakteristikos daro projektą unikaliu?**
3. **Su kokiomis nesėkmėmis dažniausiai susiduriama projektuose ir kokios jų priežastys?**

© KTU

Kas yra projektas?

- Projektas – tai **laikinos** pastangos, skirtos sukurti **unikalų** produktą, paslaugą ar rezultatą (PMI).
- Projektas – tai **unikalus**, **laikinas** darbas, siekiant gauti **specifinius** rezultatus, įvertinamus pagal vartotojo pateiktus reikalavimus.
- Projektas – tai **laikina** veikla, siekiant sukurti **unikalų ir pamatuojamą** produktą, paslaugą ar rezultatą.
- Projektas – tai **laikina** organizacija, įkurta pagrindinės organizacijos jos **keliamam rezultatui/tikslui pasiekti**.

© KTU

Projekto charakteristikos

Tikslas ir rezultatas

- Aiškūs tikslai
- Specifinis, unikalus produktas / paslauga
- Pamatuojamas rezultatas
- Aiški projekto apimtis

Laikas ir ištekliai

- Apibrėžta trukmė
- Darbas atliekamas fazėmis
- Riboti ištekliai
- Būtinas planavimas

Kontekstas ir pokytis

- Nerutininė, nefunkcinė veikla
- Strategijos komponentas
- Darbas atliekamas užsakovui
- Skatina pokyčius
- Dažnai didelis ir sudėtingas

Valdymo procesai gali kartotis, bet galutinis projekto rezultatas – visada unikalus.

© KTU

Procesų, organizacijos ir projektų valdymas



Procesų valdymas

valdo

organizacijos išteklius

Kasdienė, ciklišką, pasikartojanti veikla



Organizacijos valdymas

valdo

organizacijos strategiją

Kryptis, prioritetai, ilgalaikiai tikslai



Projektų valdymas

valdo

pokyčius ir apimtį

Laikina veikla konkrečiam pokyčiui sukurti



Kad projektai padėtų siekti strateginių tikslų, pirmiausia juos reikia atskirti nuo kasdienės, ciklišką funkcinės veiklos.

© KTU


Kas yra projekto valdymas?

APIBRĖŽTIS

Projekto valdymas – tai **žinių, įgūdžių, priemonių ir metodų** taikymas siekiant užsibrėžtų projekto tikslų, atliekant numatytas užduotis ir tenkinant projekto reikalavimus.

PAGRINDINIS TIKSLAS

Patenkinti **suinteresuotųjų šalių lūkesčius**, tinkamai ir laiku įgyvendinus projektą pagal numatytą apimtį, išteklius, biudžetą ir kokybę.

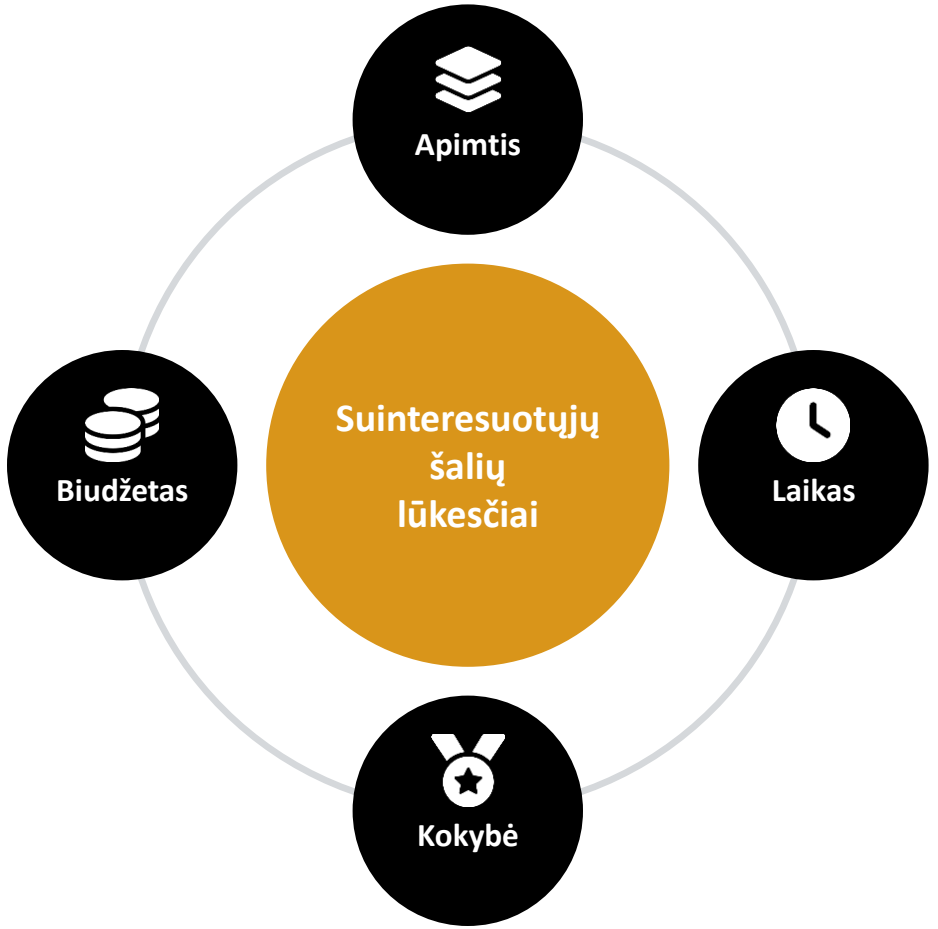

© KTU

Projekto valdymo veiklos



Reikalavimų identifikavimas

Pasiekiamų tikslų nustatymas

Kokybės, apimties, laiko ir išteklių balanso nustatymas ir palaikymas


Specifikacijų, planų ir metodų taikymas atsižvelgiant į skirtingų suinteresuotųjų šalių poreikius

© KTU

02

Nuo rezultato iki poveikio

Ką projektas sukuria ir kas nutinka po to?



Projekto valdymas – nuo rezultato iki poveikio



Ką projektas pristatė?	**Kas pasikeitė dėl to rezultato?**	**Kokia teigiama nauda atsirado?**	**Kam ir kokią vertę ši nauda sukūrė?**	**Koks platesnis, ilgalaikis poveikis?**

Tiesiogiai kontroliuoja projekto komanda → **Priklauso nuo naudotojų, organizacijos ir aplinkos**

Projekto metu → **Praėjus mėnesiams ar metams po projekto**

© KTU

Pavyzdys
DI konsultantas klientų aptarnavimo centre

OUTPUT rezultatas	**OUTCOME** pokytis	**BENEFIT** nauda	**VALUE** vertė	**IMPACT** poveikis
Sukurtas ir įdiegtas DI virtualus konsultantas, integruotas į aptarnavimo sistemą; parengtos gairės ir mokymai.	60 % standartinių užklausų apdorojama automatiškai; atsakymo laikas sutrumpėjo nuo 24 iki 2 val.	Didesnis aptarnavimo efektyvumas, mažesnės sąnaudos, didesnis klientų pasitenkinimas.	Klientams – greitis ir patogumas; darbuotojams – mažiau rutinos; vadovybei – produktyvumas.	Skaitmeninė branda, konkurencingumas, atsparumas darbo rinkos pokyčiams, pasitikėjimas e. paslaugomis.

60 %

standartinių užklausų apdorojama automatiškai

24 h → 2 h

vidutinis atsakymo klientui laikas

Output – tai, ką projektas pristato.
Value – tai, ką organizacija gauna naudodama tą rezultatą.

© KTU

Atlikite projekto analizę



DISKUSIJA

Grupėse · 15 min.

Kiekvienam projektui nustatykite:

Rezultatas **Pokytis** **Nauda**

Vertė **Poveikis**



GAMYBA

Automatizuotos įrangos priežiūros sistemos diegimas gamykloje



ŠVIETIMAS

Skaitmeninės mokymosi platformos diegimas universitete



VIEŠOSIOS ERDVĖS

Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas



ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Darbuotojų kompetencijų ugdymo programos įgyvendinimas



APLINKOSAUGA

Atliekų rūšiavimo sistemos diegimas savivaldybėje



VIEŠASIS SEKTORIUS

Išmaniosios transporto srautų valdymo sistemos diegimas mieste

© KTU

03

Kas yra projekto sėkmė?

Kodėl „laiku, pagal biudžetą ir apimtį“ jau nebepakanka?



Kuris projektas sėkmingesnis?

PROJEKTAS A

- 10 metų vėliau nei planuota
- Galutinė kaina ~14 kartų didesnė už pradinį biudžetą
- Šiandien – nacionalinis simbolis

PROJEKTAS B

- Įgyvendintas laiku
- Neviršytas biudžetas
- Pristatyti visi numatyti techniniai rezultatai
- **Naudotojai rezultatu beveik nesinaudoja**

BALSUOKITE:

A Projektas A | **B** Projektas B | **C** Abu | **D** Nei vienas | **E** Priklauso nuo to, kieno akimis vertiname

© KTU

Sidnėjaus operos namai



Operos namai statybų metu (7-asis dešimtmetis)

10 m.

vėlavimas

Planuota baigti 1963 m., atidaryta 1973 m.

×14

biudžeto viršijimas

AUD 7 mln. pradinė sąmata → AUD 102 mln. galutinė kaina

2007


UNESCO pasaulio paveldas

Šiandien – vienas atpažįstamiausių XX a. pastatų ir Australijos simbolis

Ar projektas gali būti nesėkmingas kaip projektas ir kartu labai sėkmingas kaip investicija į ateitį?

© KTU

Tradicinis projekto valdymo klausimas

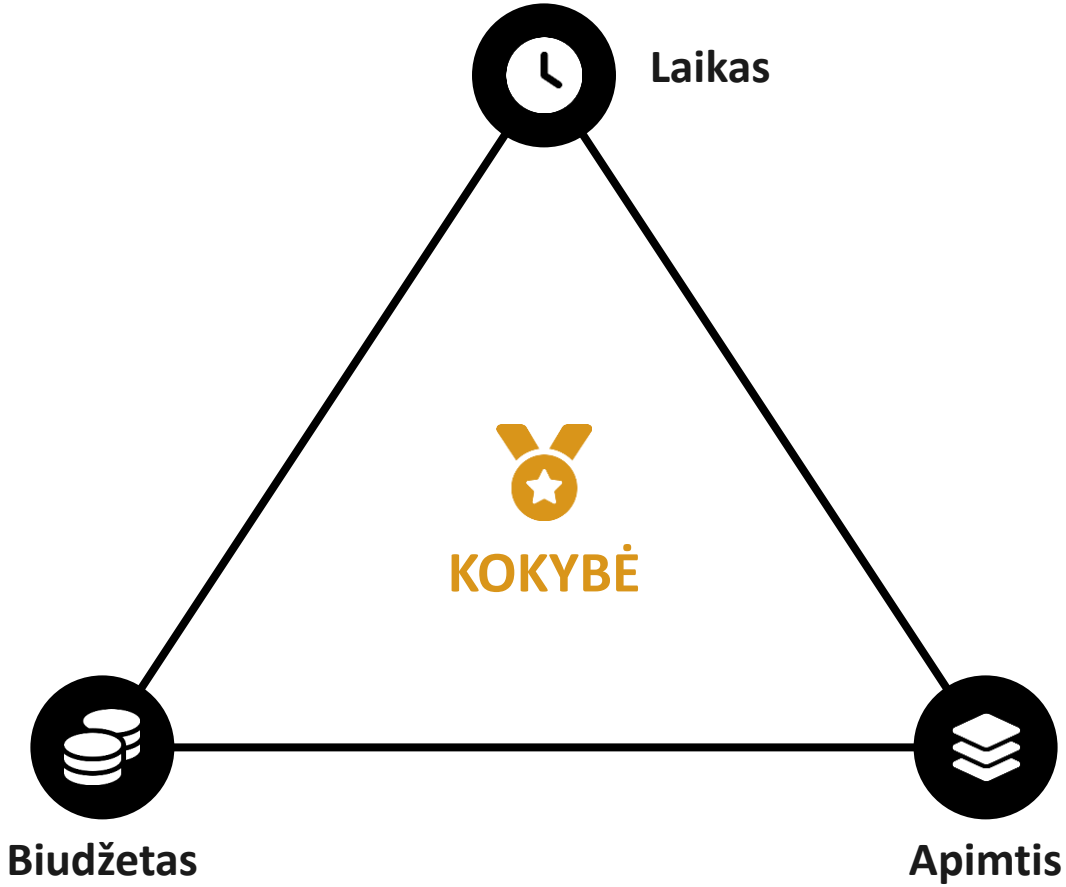

Ar pristatėme projektą:

- laiku?
- pagal biudžetą?
- pagal sutartą apimtį?
- pagal specifikaciją?

Ar tai įrodo, kad projektas sėkmingas?

Nebūtinai.


NAUJAS KLAUSIMAS

Ar pristatytas rezultatas sukūrė planuotą **pokytį ir naudą**?

© KTU

Sėkmės kriterijų evoliucija

Klausimas plečiasi: nuo „Ar gerai padarėme?“ iki „Ar verta buvo daryti?“



Efficiency
Efektyvumas

- laikas
- kaina
- techninis rezultatas

Effectiveness
Veiksmingumas

- specifikacijų atitiktis
- naudotojų pasitenkinimas
- projekto tikslų pasiekimas

Strategic success
Strateginė sėkmė

- strateginis suderinamumas
- organizaciniai pokyčiai
- naudos


Value & impact
Vertė ir poveikis

- vertės kūrimas
- naudų realizavimas
- suinteresuotųjų perspektyvos
- tvarumas
- socialinis ir aplinkos poveikis

© KTU

Projekto sėkmės kriterijai

TECHNINIAI



„Ar veikia?“

Ar rezultatas veikia taip, kaip suprojektuota?

PAGRĮSTUMO



„Ar atitinka suinteresuotųjų šalių poreikius?“

Ar sprendžia tikrą problemą tų, kuriems skirtas?

EFEKTYVUMO



„Ar apsimoka?“

Ar nauda viršija investicijas ir sąnaudas?

Reikia visų trijų elementų. Tačiau veikiantis, bet niekam nereikalingas ar neapsimokantis rezultatas – tai ne sėkmė.

© KTU

Projekto kokybė

PRODUKTO KOKYBĖ ≠ PROJEKTO VERTĖ

Galima sukurti techniškai nepriekaištingą rezultatą, kuris nesukuria jokios vertės.

1 ATITIKTIS
conformance

Ar atitinka specifikaciją?

standartas · reikalavimai · techninė specifikacija · sutartis

2 TINKAMUMAS NAUDOTI
fitness for use

Ar tinkamas naudoti?

funkcionalumas · patikimumas · naudojamumas · prieinamumas

3 SUVOKIAMA VERTĖ
perceived value

Ar naudotojas jį vertina?

patirtis · naudingumas · pasitikėjimas · priimtinumas · alternatyvų vertė

© KTU

Projekto sėkmės kriterijai

Projekto valdymo sėkmė

Ar projektas buvo suvaldytas?

- laikas
- biudžetas
- apimtis
- kokybė
- ištekliai

≠

Projekto (investicijos) sėkmė

Ar sukūrė tai, dėl ko buvo inicijuotas?

- rezultato naudojimas
- strateginis rezultatas
- naudos
- suinteresuotųjų pasitenkinimas
- vertė
- ilgalaikis poveikis

Output – tai, ką projektas pristato. Value – tai, ką organizacija gauna naudodama tą rezultatą. (Zwikael, 2025)

© KTU

Projekto sėkmė: kriterijai ir faktoriai



KRITERIJAI

Pagal ką vertiname?

- Principai
- Standartai

→ **Priimamas sprendimas** → Nepriklauso nuo projekto



FAKTORIAI

Kas lemia rezultatą?

- Aplinkybės
- Faktai
- Įtakos

→ **Rezultatų gavimas** → Priklauso nuo projekto


© KTU

Projekto užbaigimo ir suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo kriterijai

	UŽBAIGIMAS Ar pristatėme?	**PASITENKINIMAS** Ar suinteresuotosios šalys patenkintos?
Kriterijai	**Apimtis · Laikas · Kaina**	**Naudingumas · Veikimas · Kokybė**
Faktoriai	• Gebėjimas vykdyti • Įsipareigojimas vykdyti • Metodika • Verifikavimas • Technologija • Projekto valdymas	• Ekonominis pagrindimas • Validavimas • Procesas ir turinys • Standartų laikymasis • Palaikomumas ir palaikymas • Pritaikomumas • Patikimumas ir saugumas
Pagrindas	**Rizikos valdymas** – rizikos identifikavimas ir valdymas	**Kokybės valdymas** – kokybės užtikrinimas ir kontrolė

© KTU

Kas nutinka, kai projektas uždaromas?

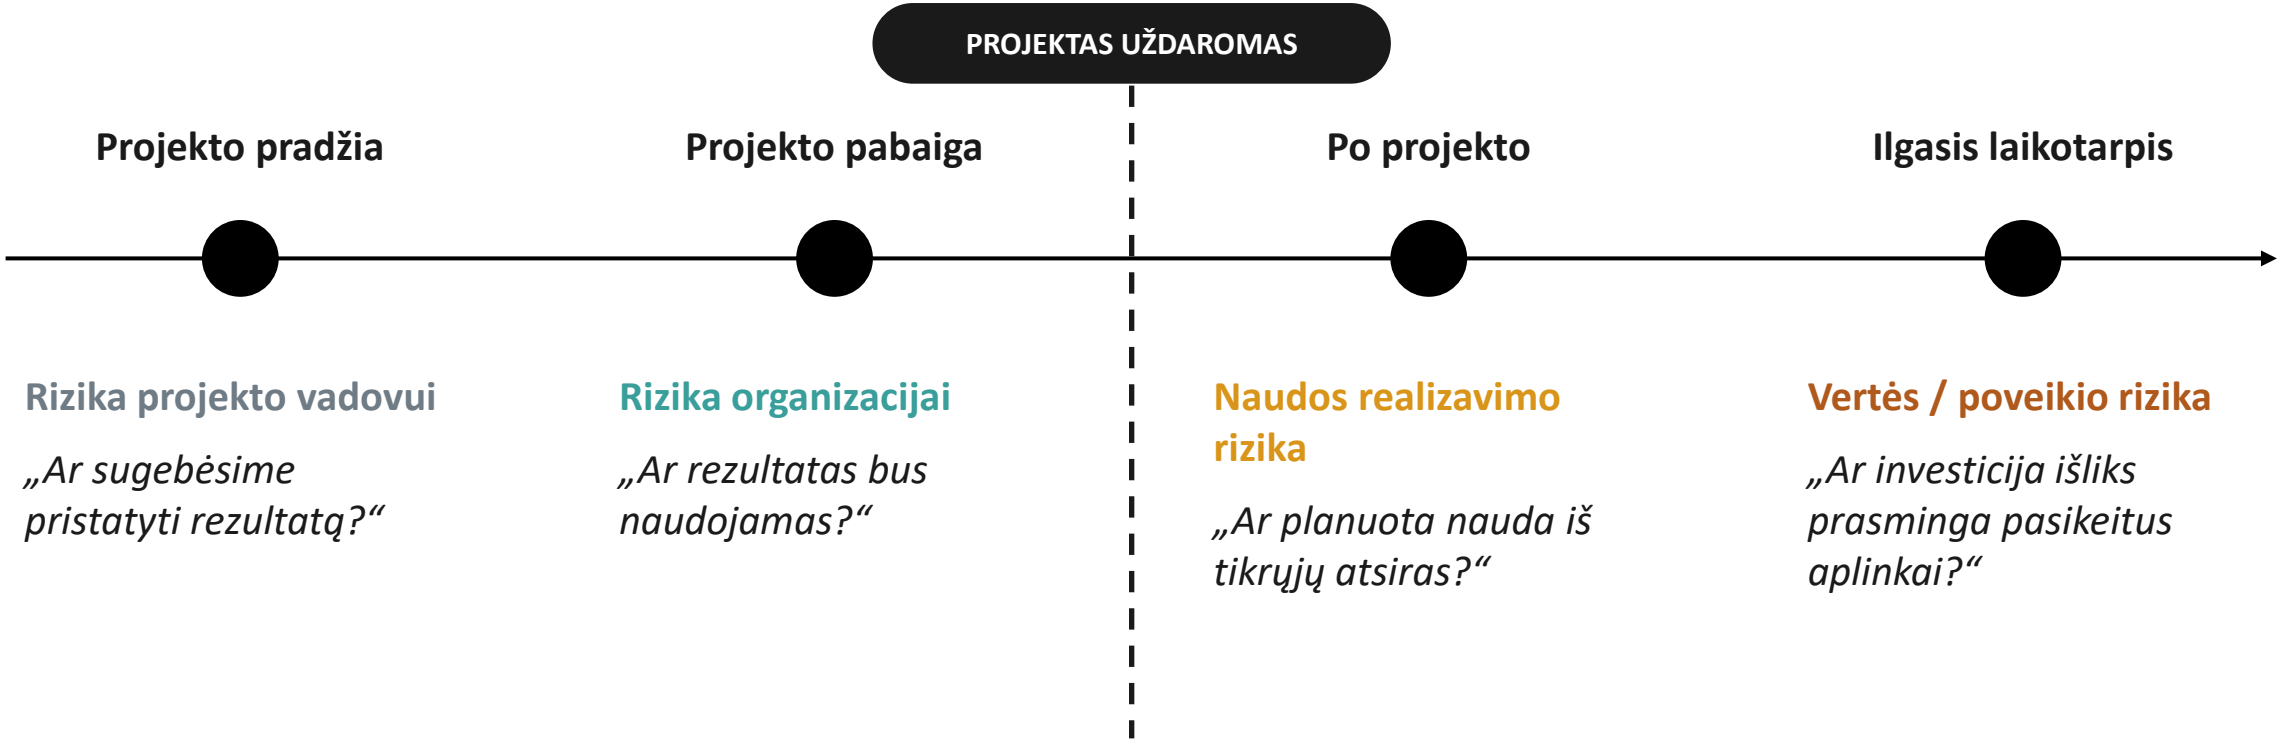

Projekto uždarymas nėra rizikos ir naudos istorijos pabaiga.

© KTU

Kas atsakingas už naudą?

Jeigu projekto vadovas atsakingas už projekto pristatymą, **kas atsakingas už naudą?**

Projekto vadovas
atsako už rezultatą (output)

Naudos savininkas (benefit owner)
atsako už naudos realizavimą

Rėmėjas / projekto savininkas
atsako už investicijos vertę

Naudos savininkas turi gebėti atsakyti:

1. Kokia nauda?
2. Kam ji naudinga?
3. Kaip ją išmatuosime?
4. Kada ji turi atsirasti?
5. Kokių pokyčių reikia, kad ji atsirastų?
6. Kas atsakingas už pokyčio įgyvendinimą?
7. Kada nustatysime, kad nauda nebus realizuota?

Nauda nėra projekto „deliverable“. Nauda yra rezultato naudojimo pasekmė.

© KTU

04

Kodėl klystame?

Kodėl sistemingai klystame vertindami ir prognozuodami projektus?



Kodėl klystama prognozuojant projektų sėkmę?

Optimizmo šališkumas
optimism bias

„Mūsų projektas bus geresnis nei vidutinis.“

Strateginis klaidinimas
strategic misrepresentation

„Jeigu pateiksime optimistiškesnį scenarijų, projektas bus patvirtintas.“

Unikalumo šališkumas
uniqueness bias

„Mūsų projektas kitoks. Ankstesni projektai mums netinka.“

219 projektų: suvokiamas unikalumas statistiškai reikšmingai susijęs su prastesniais rezultatais (Flyvbjerg ir kt., 2024)

Kuris iš šių trijų pavojingiausias – ir kodėl?

© KTU

Kaip nesuklysti?



ZOOM IN

inside view – vidinis požiūris



ZOOM OUT

outside view – išorinis požiūris

Kiek kainuos ir truks MŪSŲ projektas?

Vertinama:

- planas
- komanda
- technologija
- terminai

Kaip sekėsi PANAŠIEMS projektams?

Vertinama:

- faktinės išlaidos
- faktiniai terminai
- nukrypimai

TAČIAU

1. Pradėkite nuo ZOOM OUT
bazinė prognozė iš panašių projektų

2. Koreguokite pagal ZOOM IN
kuo mūsų projektas iš tiesų skiriasi

© KTU

Kodėl?

Individualiai · 5 min.

Po to – 5 min. aptarimas grupėje

Šiandien
2026 m. rugsėjis

+2 metai

2028 m. rugsėjis
Projektas laikomas nesėkmingu

Parašykite **5 priežastis**, kodėl jūsų projektas (rengtas praėjusiame modulyje) žlugo.

Ne: „Kas galėtų atsitikti?“

O: „Kas jau atsitiko?“

Po 5 min. suskirstykite priežastis:

techninės | finansinės | organizacinės | žmogiškosios


politinės | **susijusios su naudotojais** | **susijusios su naudų realizavimu**

© KTU

05

Kaip padidinti projekto sėkmę?

Ką daryti kad projektas būtų sėkmingas?



PMI M.O.R.E.: kaip maksimizuoti projekto sėkmę

PMI (2024): projekto sėkmė – tai vertė, verta įdėtų pastangų ir išlaidų.

M

Manage perceptions

Valdyti suvokimą

Suinteresuotosios šalys turi suvokti, kad rezultatai sukuria pakankamą vertę, palyginti su investicijomis.

O

Own success

Prisiimti atsakomybę už sėkmę

Nuo atsakomybės už įgyvendinimą – prie atsakomybės už apčiuopiamą ir suvokiamą vertę, mažinant švaistymą.

R

Relentlessly reassess

Nuolat iš naujo vertinti

Pokyčiai neišvengiami: kartu su suinteresuotosiomis šalimis nuolat peržiūrėti vertę ir koreguoti planus.

E

Expand perspective

Plėsti perspektyvą

Projekto poveikis peržengia jo ribas: vertinti platesnį kontekstą ir dermę su organizacijos tikslais.

© KTU

5 mintys, kurias verta išsinešti

1. Gerai suvaldytas projektas ≠ sėkmingas projektas.
2. **Output** – tai, ką pristatome; **vertė** – tai, ką organizacija gauna naudodama rezultatą.
3. Kokybė turi tris lygmenis: **atitiktis → tinkamumas naudoti → suvokiama vertė**.
4. Jūsų projektas nėra toks unikalus: pradėkite nuo **zoom out** ir sprendimų peržiūros.
5. Nauda turi **savininką, rodiklį ir matavimo momentą**, kas yra svarbu ir po projekto uždarymo.

© KTU

Nuo šiandien aš, kaip projektų vadovas…

…vertindamas projektą, kokį vieną klausimą užduosiu kitaip?

Papildomai: kurį sėkmės rodiklį anksčiau laikiau pakankamu, o dabar laikau nepakankamu – ir kodėl?

Užrašykite · 2 min.

Literatūra

- Pinto, J. K., Davis, K., Ika, L. A., Jugdev, K., & Zwikael, O. (2022). Coming to terms with project success: Current perspectives and future challenges. International Journal of Project Management, 40(7), 831–834.
- Zwikael, O., & Huemann, M. (2023). Project benefits management: Making an impact on organizations and society through projects and programs. International Journal of Project Management, 41(8), 102538.
- Flyvbjerg, B., Budzier, A., Christodoulou, M. D., & Zottoli, M. (2024). Uniqueness Bias: Why It Matters, How to Curb It.
- Zwikael, O. (2025). *Project Benefits Realization: A Practical Guide for Project Managers.* IPMA Project Perspectives.
- Adamantiadou, D. S., & Tsironis, L. (2025). *Leveraging Artificial Intelligence in Project Management: A Systematic Review of Applications, Challenges, and Future Directions.* Computers, 14(2), 66.

© KTU
