Proejktų rizikos ir kokybės valdymas: įvadas

Studijų modulis
Projektų rizikos ir kokybės valdymas

S190M182

Paskaitos autorės
doc. dr . Asta Daunorienė
doc. dr. Joana Ramanauskaitė
Doc. prakt. Akvilė Grigaliūnė

El. paštas
asta.daunoriene@ktu.lt
joana,ramanauskaite@ktu.lt
akvile.grigaliune@ktu.lt

01

Apie modulį

Kas tai per modulis ir kaip dirbsime kartu?



Modulio pagrindinis tikslas

Vystyti pagrindines **projektų valdymo kompetencijas** projektų kokybės ir rizikos valdymo srityse.

Kokybė

Nuo atitikties specifikacijai iki vertės naudotojui.

Rizika

Nuo rizikų registro iki sprendimų neapibrėžtumo sąlygomis.

Vertė

Nuo rezultato pristatymo iki realizuotos naudos.

© KTU

Projekto rizikos ir kokybės valdymas

Procesai (process)



Produktai




Žmonės



Kokybė + Rizika

© KTU

Bendro supratimo formavimas

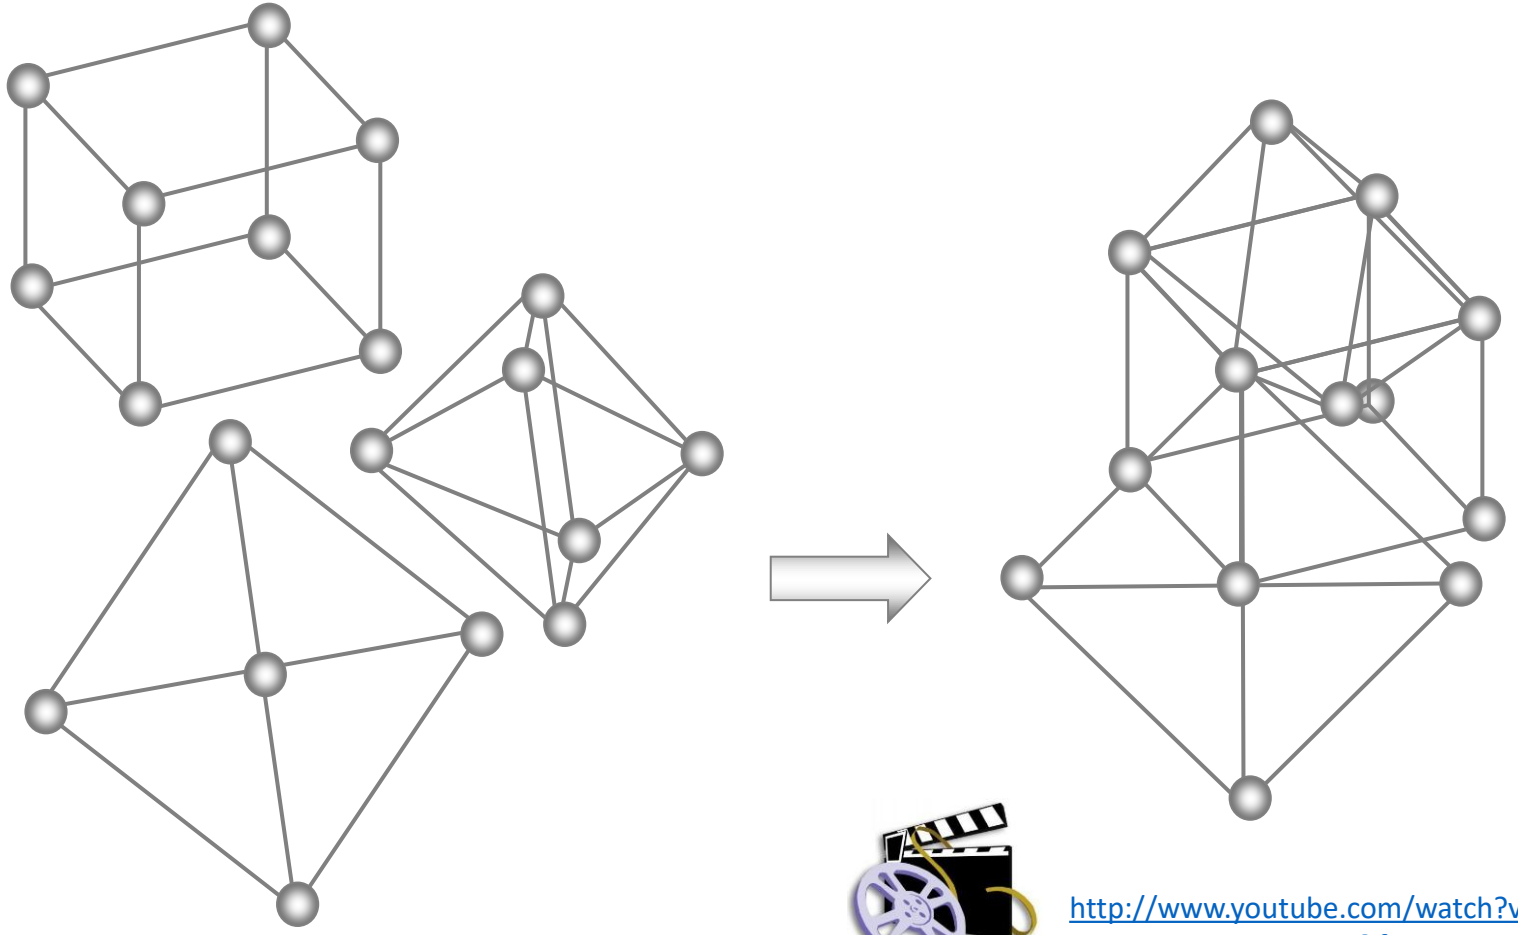



http://www.youtube.com/watch?v=XZVIWZGheXY&playnext=1&list=PLD06BAD711D039F57&feature=results_main

© KTU

Susipažinkime



PRISISTATYMAS

INDIVIDUALIAI · 3 min.

Užsirašykite atsakymus

1. **Kas aš esu? Studijų programa? Darbinė patirtis?**
2. **Kokios charakteristikos mane daro unikaliu?**
3. **Jei šiandien reikėtų valdyti projekto rizikas ir užtikrinti jo kokybę, kaip 5 balų skalėje įvertinčiau savo gebėjimus šiose srityse?**

© KTU

Mūsų susitarimai

> Rizikos ir kokybės valdymas – dviejų krypčių eismas.
> Jūs stebite stebi projektą. Projektas stebi Jus.
> O lūkesčiai ir susitarimai – kelio ženklai, padedantys išvengti susidūrimų.



LŪKESČIAI



SUSITARIMAI

© KTU

02

Ko išmoksite?

Kokius gebėjimus įgysite ir į kokius klausimus atsakysime?



Pabaigę šį studijų modulį Jūs gebėsite:

1. Analizuoti kokybės, rizikos, neapibrėžtumo, galimybių ir projekto sėkmės koncepcijas, vertinant jų tarpusavio sąsajas skirtinguose projekto gyvavimo cikluose, siekiant projekto vertės kūrimo.
2. Vertinti projekto valdymo procesus, jų tarpusavio sąsajas, atsakomybių paskirstymą ir sprendimų priėmimo mechanizmus, pagrindžiant tinkamus lyderystės ir valdymo sprendimus kokybės ir rizikos kontekste.
3. Analizuoti suinteresuotųjų šalių poreikius, reikalavimus ir priėmimo kriterijus, įvertinant jų poveikį projekto kokybei, rizikai ir vertei bei pagrindžiant sprendimus, atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir pasitenkinimą.
4. Taikyti tinkamus projektų kokybės planavimo, užtikrinimo, kontrolės ir problemų sprendimo metodus, įtraukiant duomenis ir įvertinant jų tinkamumą konkrečiam projekto kontekstui.
5. Integruoti projekto veiklos kontrolės metodus analizuojant projekto veiklos duomenis ir įvertinant projekto rezultatų, laiko, kaštų, kokybės ir rizikos tarpusavio sąsajas.
6. Vertinti projekto rizikas, neapibrėžtumą ir galimybes, pasirenkant tinkamus rizikos identifikavimo, analizės ir valdymo metodus bei pagrindžiant sprendimus atsižvelgiant į projekto gyvavimo ciklą ir kontekstą.
7. Integruoti kokybės ir rizikos vadybos žinias kompleksiškų projektų kontekste, vertinant jų sistemines sąsajas ir valdymo sprendimus, kuriant pagrįstus nuolatinio tobulinimo, organizacinio mokymosi ir projekto vertės didinimo sprendimus.

© KTU

Studijų modulio klausimai

1. KĄ VADINAME PROJEKTO SĖKME?
2. KAS IR KAIP PROJJEKTE PRIIMA SPRENDIMUS?
3. KAIP VEIKIA PROJEKTAS PER VISĄ GYVAVIMO CIKLĄ?
4. KAM PROJEKTE KURIAME VERTĘ IR KOKIE YRA REIKALAVIMAI?
5. KAIP UŽTIKRINAME PROJEKTO KOKYBĘ?
6. KAIP JĄ MATUOJAME IR GERINAME?
7. KAIP KONTROLIUOJAME PROJEKTO VEIKLĄ?
8. KAIP VALDOME RIZIKĄ IR NEAPIBRĖŽTUMĄ?
9. KAIP MĄSTOME APIE PROJEKTO KOMPLEKSIŠKUMĄ?
10. KAIP IŠ PROJEKTŲ MOKOMĖS IR DIDINAME VERTĘ?

© KTU

03

Kaip dirbsime

Semestro ritmas: temos, diskusijos ir atsiskaitymai



Paskaitų ir praktinių užsiėmimų planas

09.10	**Įvadinė paskaita + 1 TEMA.** Kokybė, rizika ir projekto sėkmė: nuo atitikties iki vertės
09.17 Nuotoliu	**2 TEMA.** Lyderystė ir sprendimų priėmimas valdant kokybę ir riziką
09.24 Nuotoliu	**3 TEMA.** Projekto gyvavimo ciklas: kokybės, rizikos ir neapibrėžtumo valdymas
10.01	**Diskusijos.** „Projekto kokybės valdymas ir organizacijos strategija“ · „Duomenys ir dirbtinis intelektas valdant kokybę ir riziką“
10.08 Nuotoliu	**4 TEMA.** Projektų suinteresuotosios šalys, reikalavimai ir priėmimo kriterijai
10.15	**Diskusijos.** „Suinteresuotųjų šalių interesų konfliktai projektuose“ · „Kokybės standartai – pagalba ar biurokratija?“
10.22 Nuotoliu	**5 TEMA.** Projektų kokybės planavimas, užtikrinimas ir kontrolė
10.29	**6 TEMA.** Kokybės valdymo metodai ir problemų sprendimas — Tarpinis projekto pristatymas: kokybės dalis
11.05	**Tarpinis egzaminas I.** Žodžiu
11.12 Nuotoliu	**7 TEMA.** Projektų kontrolė: laikas, kaštai, kokybė, rizika ir uždirbta vertė
11.19	**Diskusijos.** „Proaktyvus ir reaktyvus rizikos valdymas“ · „Nežinomybė ir unknown unknowns“
11.26	**8 TEMA.** Rizikos, neapibrėžtumo ir galimybių analizė bei valdymas — Tarpinis projekto pristatymas: rizikos dalis
12.03 Nuotoliu	**9 ir 10 TEMOS.** Kompleksiniai projektai ir sisteminis mąstymas · Nuolatinis tobulinimas, organizacinis mokymasis ir vertės didinimas
12.10	**Tarpinis egzaminas II.** Žodžiu
12.17	**Modulio apžvalga.** Pakartotiniai atsiskaitymai


Tema · Diskusija · Atsiskaitymas

© KTU

04

Kaip vertinsime

Iš ko susidaro galutinis pažymys ir ko tikimasi



Vertinimo struktūra



Egzaminas - Projekto kokybės ir rizikos vertinimo planas (projekto ataskaita)

- 40 proc. galutinio pažymio
- Sudaro 2 dalys. 1 dalis - projekto **kokybės** ir 2 dalis - projekto **rizikos** planas.
- Pristatoma egzamino metu.

Žodinis iliustruotas pranešimas (diskusija)

- 20 proc. galutinio pažymio.
- Semestro metu studentai pagal dėstytojo parengtas temas pasiruošia teminei diskusijai.

Tarpinis egzaminas (2k)

- 40 proc. galutinio pažymio
- Žodžiu, atviri klausimai, žinių pritaikymo klausimai

Teigiamai neatsiskaičius (5≤) už semestro darbus neleidžiama laikyti egzamino.

© KTU

Vertinimo kriterijai

Tarpinis egzaminas
žodžiu

- Atsakymų turinio išsamumas, tikslumas ir aktualumas
- Atsakymų pagrindimas ir argumentavimas
- Gebėjimas taikyti ir integruoti skirtingas žinias bei teorines prieigas
- Gebėjimas teorines žinias susieti su praktiniais pavyzdžiais
- Atsakymų struktūra ir loginis nuoseklumas
- Profesionali komunikacija ir terminologijos vartojimas

Kokybės ir rizikos vertinimo ataskaita
grupinis darbas

- Remtasi naujausiais literatūros šaltiniais
- Parengta pagal metodiką ir raštvedybos reikalavimus
- Komandos narių indėlio įvertinimas
- Rengta atvykstant į konsultacijas ir atsižvelgiant į pastabas
- Parengta ir pristatyta laiku
- Išsami, nuosekli, atsako į pateiktą temą
- Pateiktos lentelės su komentarais ir aiškios išvados

© KTU

Vertinimo kriterijai

Pasiruošimas

- Diskusija vedama pasirinktos tematikos ribose
- Remiamasi moksliniais šaltiniais
- Pateikti pasiruošimo įrodymai: juodraštis, klausimai, straipsnių nuorodos

Pristatymas

- Tema pristatoma trumpai ir analizuojama
- Informacija perteikta aiškiai
- Diskusija struktūrizuota ir apgalvota
- Valdomas pristatymo laikas

Moderavimas


- Palaikoma diskusija su auditorija
- Keliami kompleksiniai klausimai
- Pateikiamas apibendrinimas su pagrindiniais akcentais

DISKUSIJOS LOGIKA

Tema → **Realus projektas** → **Problema** → **Dilema** → **Sprendimas** → **Nauja informacija** → **Persvarstymas** → **Refleksija**

© KTU

Studijų vertinimas (patarimai)

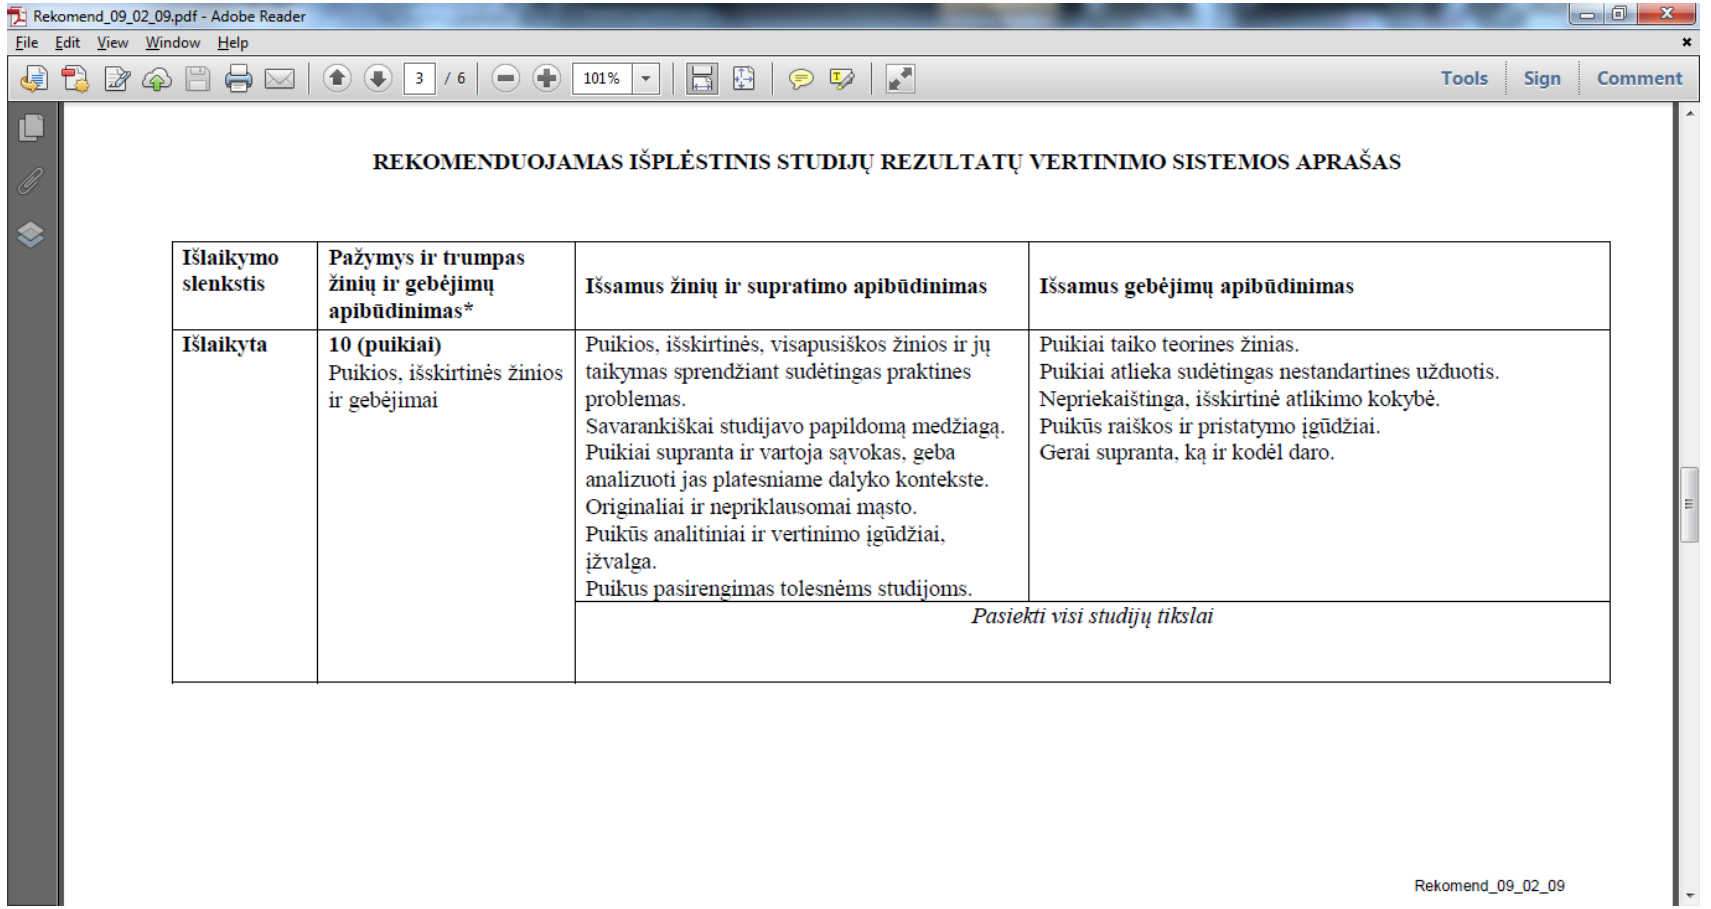
Rekomend_09_02_09.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

3 / 6 101% Tools Sign Comment

REKOMENDUOJAMAS IŠPLĖSTINIS STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMO SISTEMOS APRAŠAS

Išlaikymo slenkstis	**Pažymys ir trumpas žinių ir gebėjimų apibūdinimas***	**Išsamus žinių ir supratimo apibūdinimas**	**Išsamus gebėjimų apibūdinimas**
Išlaikyta	**10 (puikiai)** Puikios, išskirtinės žinios ir gebėjimai	Puikios, išskirtinės, visapusiškos žinios ir jų taikymas sprendžiant sudėtingas praktines problemas. Savarankiškai studijavo papildomą medžiagą. Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, geba analizuoti jas platesniame dalyko kontekste. Originaliai ir nepriklausomai mąsto. Puikūs analitiniai ir vertinimo įgūdžiai, įžvalga. Puikus pasirengimas tolesnėms studijoms.	Puikiai taiko teorines žinias. Puikiai atlieka sudėtingas nestandartines užduotis. Nepriekaištinga, išskirtinė atlikimo kokybė. Puikūs raiškos ir pristatymo įgūdžiai. Gerai supranta, ką ir kodėl daro.
		Pasiekti visi studijų tikslai	

Rekomend_09_02_09

© KTU

Projekto kokybės ir rizikos vertinimo planas (grupinis semestro darbas/projekto ataskaita)

Grupinis semestro darbas

Semestro metu turėsite parengti projekto rizikos ir kokybės valdymo planą, naudodamiesi pateiktu šablonu. Turėsite remtis savo ankstesniuose Projektų valdymo kompetencijų moduliuose parengtu projekto aprašu. Grupeles turi sudaryti 3–4 studentai.
Rengdami planą turėsite pritaikyti projektų kokybės ir rizikos valdymo principus konkrečiam pasirinktam projektui: nustatyti projekto kokybės reikalavimus ir rodiklius, suplanuoti kokybės užtikrinimo ir kontrolės veiklas, paskirstyti atsakomybes, identifikuoti ir įvertinti svarbiausias projekto rizikas bei numatyti pagrįstas jų valdymo priemones. Tikimasi ne teorinių sąvokų atkartojimo, bet argumentuoto jų taikymo konkretaus projekto kontekste. Plano dalys turi būti tarpusavyje nuoseklios ir susietos su projekto tikslais, veiklomis, rezultatais bei suinteresuotomis šalimis.
Vertinimo kriterijai:

- Projekto kokybės planavimas – 20 %
  Kokybės reikalavimų, kriterijų ir rodiklių pagrįstumas; jų sąsajos su projekto tikslais, veiklomis ir rezultatais; tinkamas kokybės vertinimo metodų ir atsakomybių parinkimas.
- Kokybės užtikrinimas, kontrolė ir tobulinimas – 20 %
  Numatyti konkretūs ir projekto kontekstui tinkami kokybės užtikrinimo, kontrolės, analizės ir tobulinimo veiksmai. Aiškiai parodyta, kaip bus stebima atitiktis nustatytiems kokybės reikalavimams.
- Projekto rizikų vertinimas ir valdymas – 20 %
  Identifikuotos projektui reikšmingos rizikos, įvertinta jų tikimybė ir poveikis projekto tikslams, kokybei, kaštams ir trukmei. Parinktos pagrįstos ir realistiškos rizikos valdymo priemonės.
- Plano nuoseklumas, pagrįstumas ir parengimo kokybė – 20 %
  Visos plano dalys tarpusavyje dera ir yra susietos su konkrečiu projektu. Sprendimai argumentuoti, vartojama tinkama projektų kokybės ir rizikos valdymo terminija, informacija pateikta aiškiai ir profesionaliai. Vertinamas ne šablono užpildymo išsamumas, o gebėjimas jį prasmingai pritaikyti pasirinktam projektui.
- Individualus darbo gynimas egzamino metu – 20 %
  Studentas turi gebėti paaiškinti ir pagrįsti bet kurią parengto projekto kokybės ir rizikos valdymo plano dalį. Egzamino metu studentui pateikiami klausimai, kuriais vertinamas jo supratimas apie grupės parengtame plane priimtus sprendimus, gebėjimas paaiškinti jų logiką, taikytus metodus, rodiklius, rizikų vertinimą ir pasirinktų valdymo priemonių pagrįstumą. Atskiras plano pristatymas rengiamas nebus.

ktu kauno technologijos universitetas 1922

LT

MOODLE

KTU virtualioji mokymosi aplinka

© KTU

Žodinis iliustruotas pranešimas (diskusija)

Užduotis ir tikslas

Šios grupinės užduoties metu Jūs turėsite galimybę ne tik įsigilinti ir pristatyti pasirinktą projekto rizikos ar kokybės valdymo temą. Jūs **tapsite pasirinktos temos ekspertais ir sukursite galimybę pagilinti žinias kolegoms**. Jūsų grupės užduotis – parengti ir pravesti **probleminę, interaktyvią diskusiją**, kurioje kolegos turės analizuoti realistišką projekto situaciją, priimti sprendimus, pagrįsti savo poziciją ir ją, atsiradus naujai informacijai, gebėti persvarstyti. Todėl svarbiausias klausimas, į kurį turite atsakyti kurdami diskusiją:

> **Ar po mūsų diskusijos kolegos supras šią temą giliau negu prieš ją?**

Atlikdami užduotį turėsite galimybę:

- pagilinti pasirinktos projekto rizikos ar kokybės valdymo temos supratimą;
- išmokti teorines žinias taikyti realistiškoje projekto situacijoje;
- analizuoti sudėtingas ir ne vienareikšmes projekto problemas;
- priimti sprendimus esant rizikai ir neapibrėžtumui;
- argumentuoti ir ginti savo poziciją;
- kritiškai vertinti kitų sprendimus;
- mokytis iš naujos informacijos ir persvarstyti priimtus sprendimus;
- ugdyti diskusijos moderavimo ir fasilitavimo gebėjimus;
- mokytis naudoti DI kaip mokymosi ir analitinį partnerį.

Diskusijos logika

> **TEMA → REALUS PROJEKTAS (ATVEJIS) → PROBLEMA → DILEMA → SPRENDIMAS → NAUJA INFORMACIJA → SPRENDIMO PE**

ktu kauno technologijos universitetas

LT

MOODLE


KTU virtualioji mokymosi aplinka

© KTU

05

Ištekliai ir pradžia

Medžiaga, literatūra ir pirmasis modulio klausimas




Refleksijai

- Mokymosi momentai !
- Geros idėjos 
- Labai patiko 
- Turėčiau pagalvoti apie ?

© KTU

Literatūra

- Lock, D. (2020). Project management. Routledge.
- Kerzner, H. (2025). Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling (14th ed.). Wiley.
- Project Management Institute. (2025). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) and The standard for project management (8th ed.). Project Management Institute.
- Kerzner, H. (2025). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (14th ed.). Wiley.
- MacKay, G. (2024). Evolving project leadership: From command and control to engage and empower. Association for Project Management.



© KTU

Naudingos nuorodos

- http://www.pmi.org/ Projektų valdymo institutas (PMI- project management institute)
- http://www.lsd.lt Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūra
- http://www.efqm.org Europos kokybės vadybos fondas (EFQM – European Foundation for Quality Management)
- http://www.eoq.org Europos kokybės organizacija (EOQ - European Organization for Quality)

© KTU
